




Alma på KTHB

Implementeringsprocessen

Maria Patja & Tommy Westergren

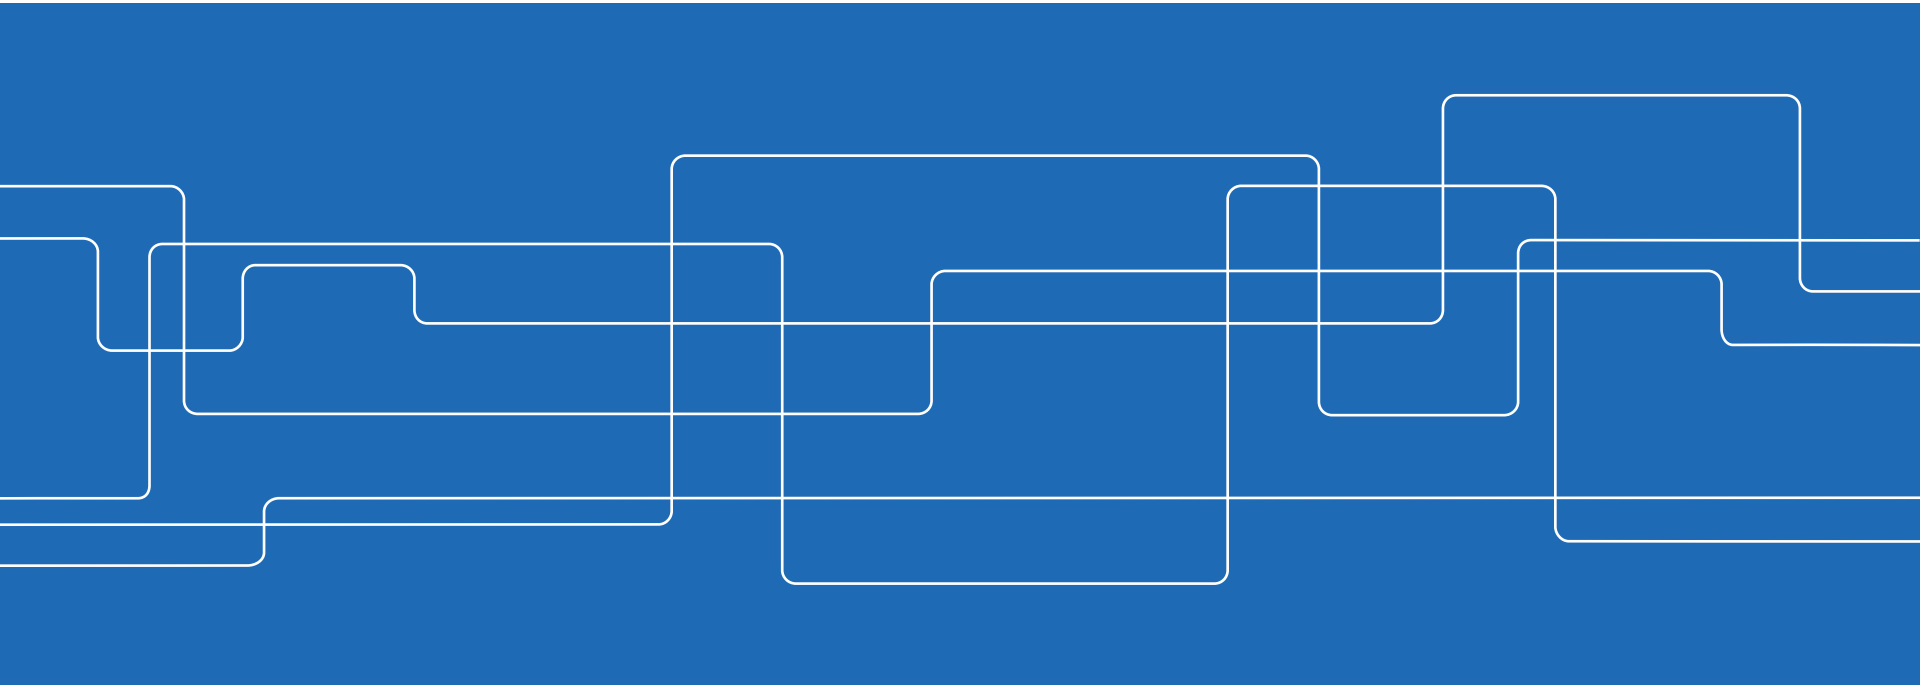



HEJ 😊



Nuvarande system

- Millennium
- SFX
- PRIMO
- LibERM
- Metalib
- Agresso
- RT



Syfte med nytt system

- Förbättrade processer
- Snabbare leverans
- Färre system
- Minskade driftskostnader
- Hostad lösning
- Molnbaserat system
- Integrationer mot andra system
- Bättre analysverktyg

 Ett anbud



Implementeringsteamet

- Michael Welin-Berger: Extern projektledare
- Thomas Lind: Integrationer, Primo, systemfrågor
- Nils Jansson: Processkartläggning, e-resurser
- Maria Patja: Konfiguration, städning, migrering, systemfrågor
- Tommy Westergren: Konfiguration, städning
- Magnus Sandgren: Primo, systemfrågor
- Anders Robertsson & Elisabeth Hammam: Utbildning & kommunikation



Ursprunglig tidplan

mars – september

Nackdelar:

- Utbildning av personalen under sommaren
- Kort tid för våra utbildare att förbereda sig
- Terminsstarten problematisk för "go live"



Reviderad tidplan

mars – november

Go live 4 november!

Fördelar:

- Mer tid till implementering och utbildning
- Behöver inte gå live vid terminsstart
- Inga schemalagda uppgifter under semestertid

Nackdelar:

- Ett sommaruppehåll rensar minnet 😊
- En utdragen process



Utbildning för projektteamet

Grundutbildning

- För hela projektteamet
- Videobaserat
- Review sessions med Ex Libris
- Dokumentation

Certification Training

- För administratörer



Utbildning av personal

- Fördel om utbildarna kommer in så tidigt så möjligt i projektet och deltar i projektmöten
- Flipped classroom, självstudier följt av riktade utbildningstillfällen
 - cirkulation
 - katalogisering
 - fjärrlån
 - förvärv (tryckt)
 - förvärv (elektroniskt)
 - course reserves



Städning i katalogen

- Påbörjades innan projektstart
 - Institutionsbibliotekens poster
 - Rester från tidigare standarder, samarbeten mm.
 - MARC-fält
 - Millenniums konfiguration
- Dokumentation från Ex Libris
- Prioritering
 - Innan migrering (obligatoriska fält etc)
 - Mappning under migreringen
 - Efter migrering (vad blev fel?)
 - I Alma
- Lärdomar: Fler mallar, mer konsekvens 😊



Konfiguration

- Grundläggande konfiguration genom excelfil
- Godkänd certifieringsutbildning krävs för att komma åt all konfiguration
- Ändringar sker genom Ex Libris projektteam
- Så få ändringar som möjligt i Millennium under denna period
- Anpassningar för Arkitekturbibliotekets flytt



Migrering från Millennium

- I princip problemfritt från Millennium
- field mapping form, migration form
- PIN-koder
- Interpunktation i summor
- Pågående transaktioner
- Information från dubblerade fält i Millennium hamnar i samma fält i Alma
- Utlåningsstatistik migreras inte, men kan läggas in i noteringsfält
- Fjärrlån migreras inte



Migrering från andra system

- SFX – sköttes av Ex Libris
- LibERM – kunde inte exporteras



Integrationer

- Agresso
 - Skrotades eftersom arbetsinsatsen inte motsvarade nyttan (få betalningar)
 - Ekonomiavdelningen sa nej
- Låntagare från SIS
 - I samarbete med KTH IT
- Libris fjärrlån
- Libris katalogisering
- Leverantörer för förvärv
- Skrivare
- Låneautomater, RFID-plattor
- Primo



Primo

- "Ny" Primo
- Anpassningar i Primos gränssnitt (låntagarsidor)
- Inloggning i Primo
- Gick inte att kopiera konfigurationen rakt av enligt Ex Libris
- En hel del inställningar måste kontrolleras och korrigeras
- Länkar på service page ("SFX-menyn"), utöver fulltext, får man definiera själv
 - Länk, parametrar man vill skicka samt villkor för när länkarna ska visas.
- [Ny Primo](#) / [Gammal Primo](#)



Libris fjärrlån

- Fjärrinlån kommer att importeras från Libris till Alma
- Fjärrutlån sker som idag – ingen koppling mellan Alma och Libris
- Målsättningen är högre grad av interoperabilitet – under utveckling



Libris katalogisering

- Kommer till en början att fungera som idag
- Hänger samman med förvärvsprocessen
- Normaliseringsregler
- Framtida plan – automatisk synkning
- beroende på Libris XL



Förvärv – kopplingar till leverantörer

- Olika processer beroende på tekniska möjligheter
 - Beställningar direkt i Alma
 - Beställningar direkt hos leverantören



GO LIVE!

- Stänger av katalogisering tre veckor innan go live
- En sista städkoll
- Stänger av konfigureringsmöjligheten tre veckor innan go live
- Stänger av cirkulation i Millennium (och låneautomater) en knapp vecka innan go live – cirkulation sker i Alma Offline Circulation och laddas upp till Alma
- Extra stängda dagar i Millennium för att minska arbetet i lånedisken
- Primo/OPAC sätts till read only en knapp vecka innan go live



Några skillnader mellan Alma & Millennium

- Roller & rättigheter
- Personlig inloggning för personalen
- Låneregler (14/90 t.ex.)
- Primo som användargränssnitt
- Andra arbetsflöden
 - work orders
 - task lists
- Brev, utskick, kvitton (t.ex. språk)
